DOKUMENTASJON AV SPRINT

Gruppe08

NOVEMBER 28, 2025

PATRICK VIDREQUIN, THANH DAT DOAN, INGRID SKOGE, NORA JELLUM, INGRID NIENHUIS, SINDRE VETHE, KRISTER ERIKSEN, EVEN GARLI

Contents

Illustrert sprint:.....2
Refleksjon:.....7
Hva ville dere gjort annerledes hvis dere skulle gjennomføre en lignende sprint igjen? 8

Formål og hvorfor vi brukte design sprint:

Vi brukte Google Design Sprint for å redusere risiko tidlig ved å skape en felles problemforståelse, prioritere kjernebehov og etablere en tydelig brukerflyt før vi startet teknisk utvikling. Dette er nyttig fordi det gjør at teamet kan teste og avklare de viktigste delene av produktet før vi bruker tid på implementasjon.
Resultatet ble et felles visuelt grunnlag I Mrio som senere forenklet design valg og urforming av nettsiden.

Gjennomføring dag for dag:

Dag 1 - Introduksjon og felles ramme

- Etablerte felles forventninger, rolleavklaring og arbeidsflyt i Miro.
- Avklarte hva vi måtte få svar på for å kunne definere en høvding.

Dag 1-2 - HKV-spørsmål og langsiktige mål

- Formulerte 'Hvordan kan vi...'-spørsmål for å gjøre utfordringene konkrete og handlingsbare.
- Definerte langsiktige mål for å sikre at løsningens retning hang sammen med business caset.

Dag 2 - Sprintspørsmål og kartlegging

- Utformet sprintspørsmål som beskrev hva vi måtte validere for å kunne gå videre.
- Kartla brukerreisen og identifiserte hvor verdien skapes, og hvor risiko/uklarheter ligger (kravtolking, underleverandørdata, rapport).

Dag 3 - Konseptgalleri og valg

- Hver deltaker skisserte løsningsforslag, som ble samlet i et konseptgalleri.
- Gjennomførte lynkritikk og prioriterte ideer gjennom diskusjon og avstemning.

Dag 4 - Storyboard

- Lagde storyboard for å beskrive prototypen som en sammenhengende brukerhistorie.
- Storyboardet fungerte som en praktisk spesifikasjon for hvilke skjermer som trengs og hvordan systemet skal svare på brukerhandlinger.

Dag 5 - Prototype og oppsummering

- Utviklet en tydeligere prototype med sentrale skjermer og hovedflyt.
- Oppsummerte beslutninger, åpne spørsmål og hva som måtte tas videre inn I Scrum-sprinter.

Illustrert sprint:

Introduksjon til gruppen:

HKV-spørsmål:



Langsiktige mål:

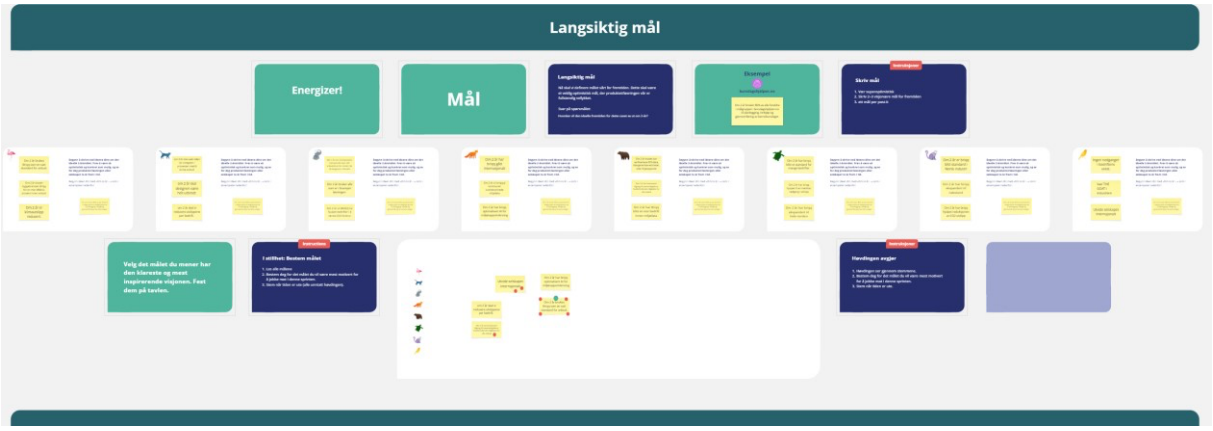

Sprintspørsmål:

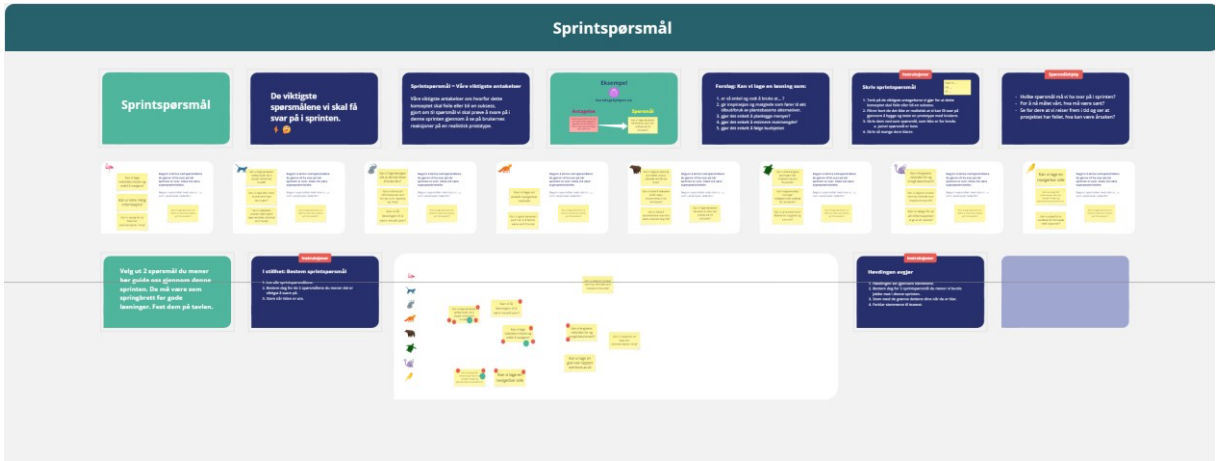

Kart:

Konseptgalleri:

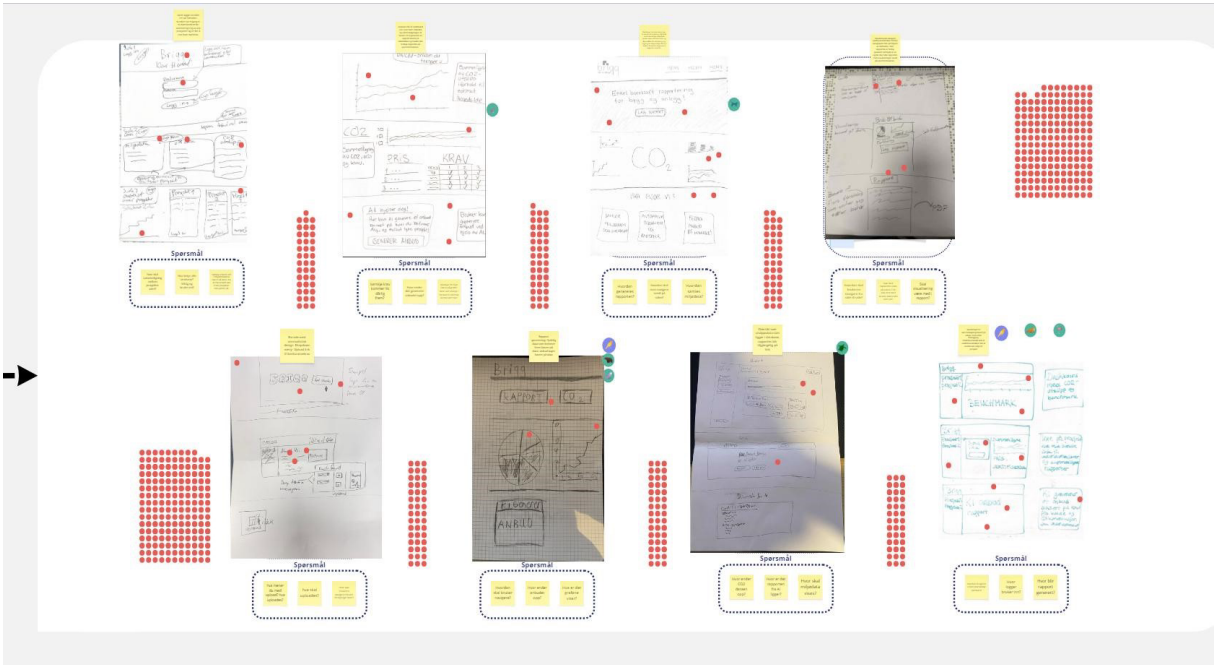

Lynkritikk/begrunnelse av valg:



Brukertestflyt:



Matrise:

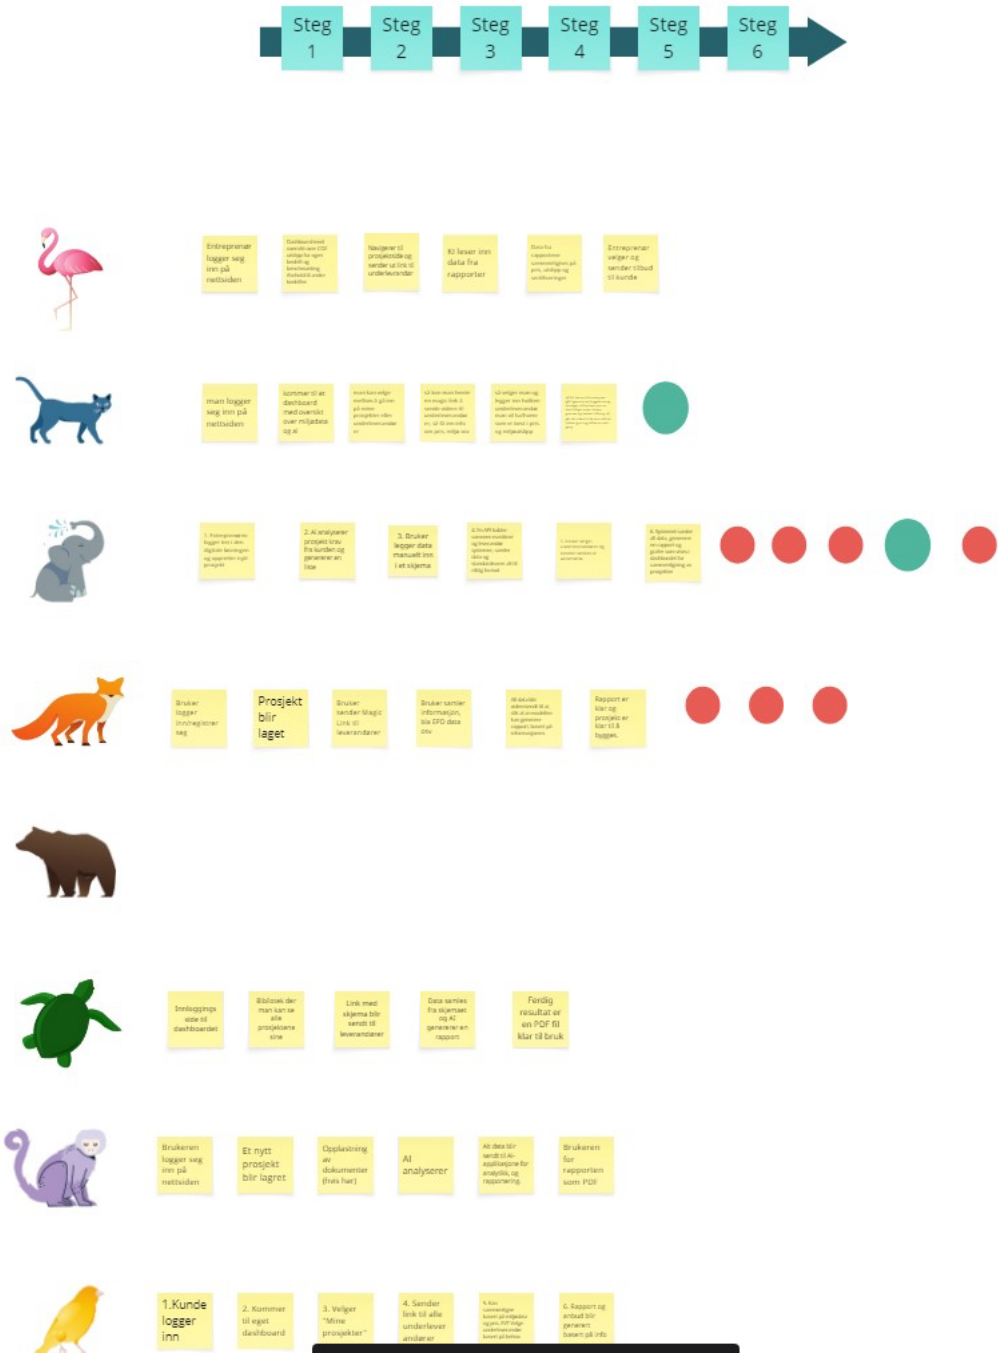
Steg 1
Steg 2
Steg 3
Steg 4
Steg 5
Steg 6
Entreprenør logger seg inn på nettsiden
Navigerer til prosjektside og sender ut link til underleverandør
KI leser inn data fra rapporter
Entreprenør velger og sender tilbud til kunde
man logger seg inn på nettsiden
kommer til et dashboard med oversikt over miljødata og AI
2. AI analyserer prosjekt krav fra kunden og genererer en liste
3. Bruker legger data manuelt inn i et skjema
Bruker logger innregistrer seg
Prosjekt blir laget
Bruker sender Magic Link til leverandører
Bruker samler informasjon, bla EPD data osv
Rapport er klar og prosjekt er klar til å bygges.
Innloggings side til dashboardet
Bibliotek der man kan se alle prosjektene sine
Link med skjema blir sendt til leverandører
Data samles fra skjemaet og AI genererer en rapport
Ferdig resultat er en PDF fil klar til bruk
Brukeren logger seg inn på nettsiden
Et nytt prosjekt blir lagret
Opplasting av dokumenter (hvis har)
AI analyserer
Brukeren for rapporten som PDF
1.Kunde logger inn
2. Kommer til eget dashboard
3. Velger "Mine prosjekter"
4. Sender link til alle underlever andrer

Storyboard stegvis:

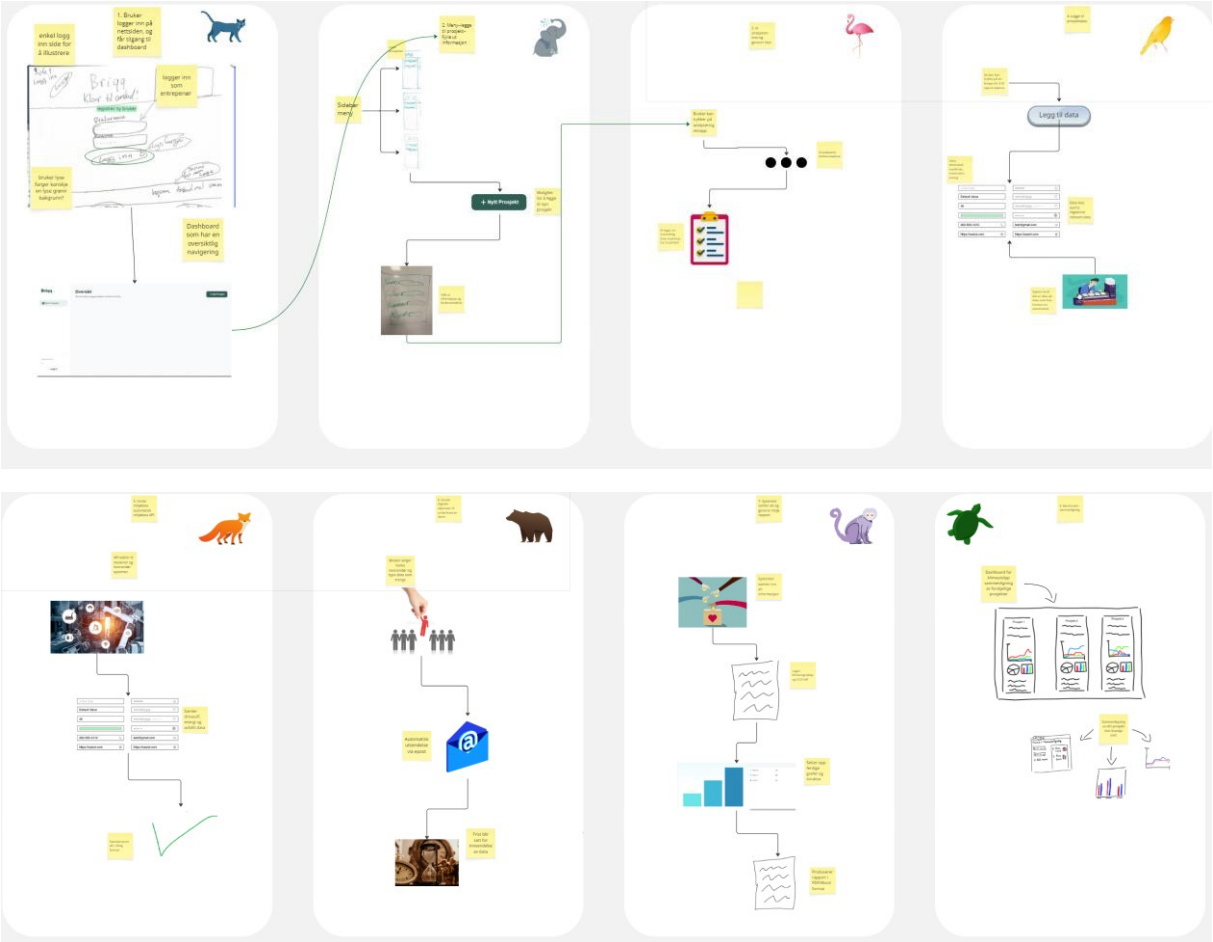

Prototype:

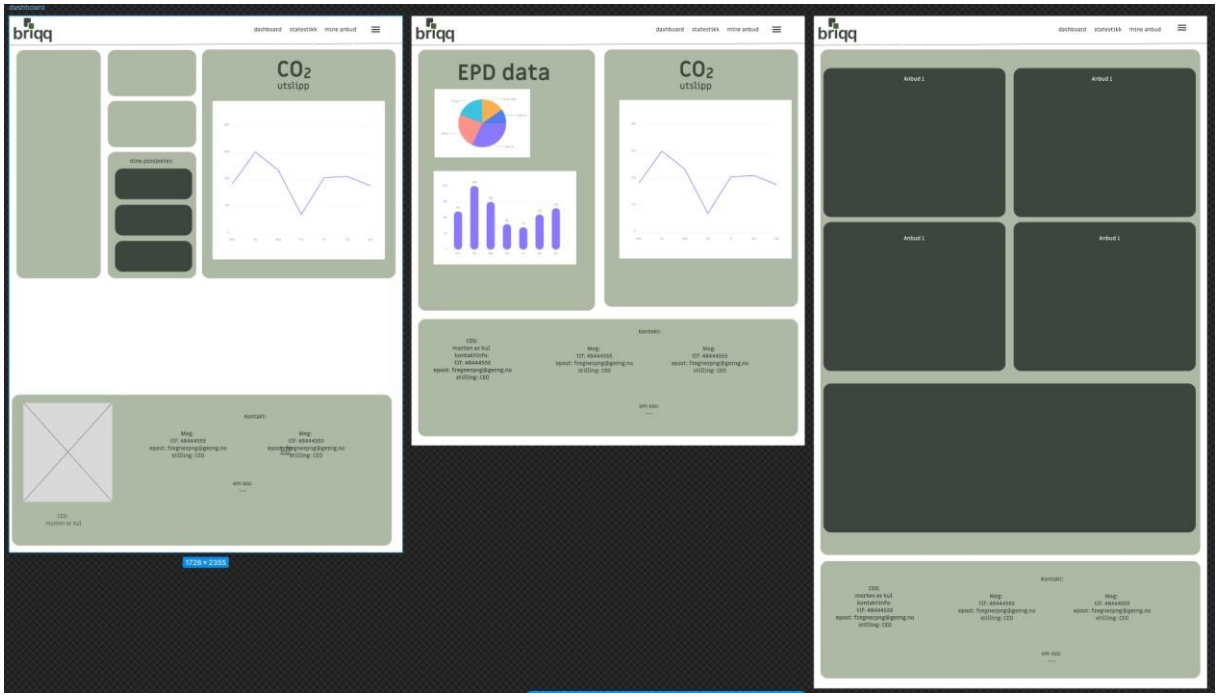

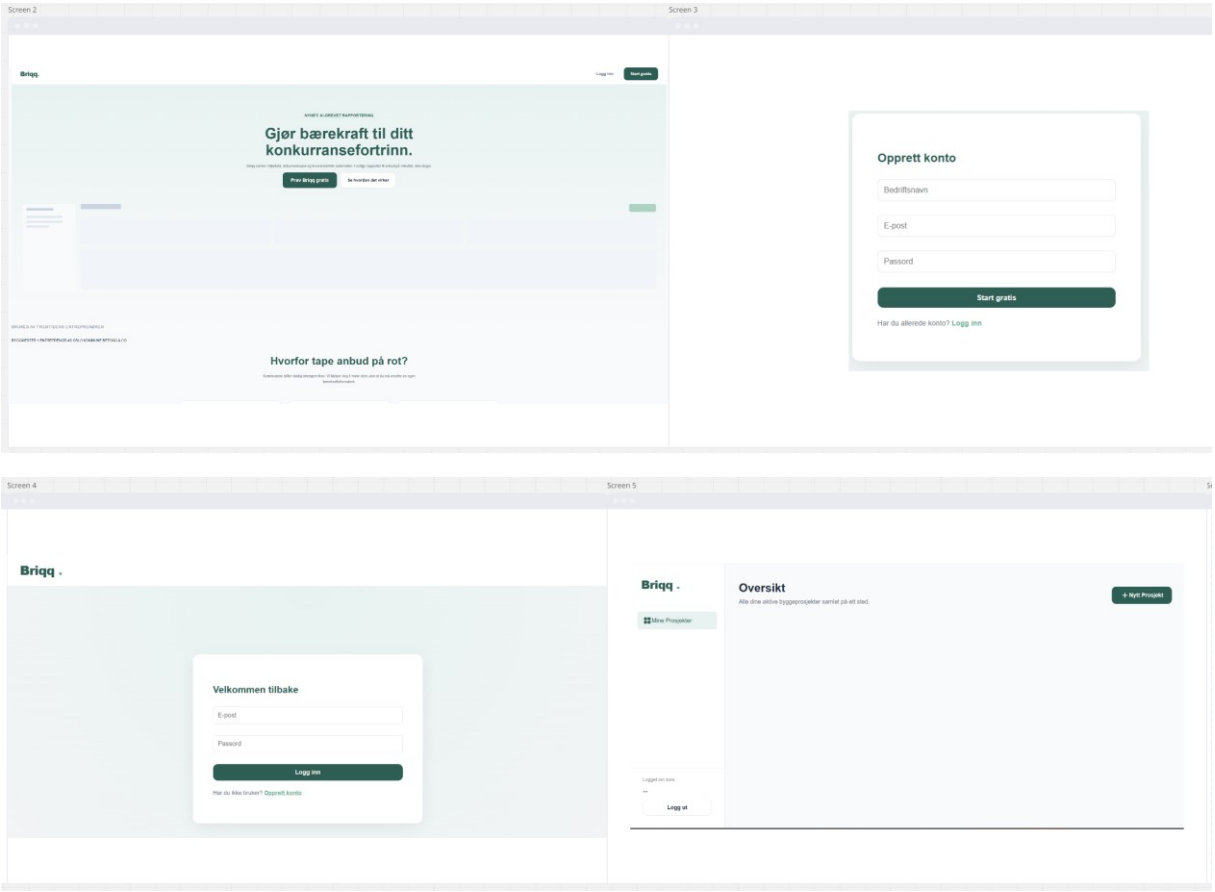

Refleksjon:

Fant dere svar på sprint-spørsmålene?

Vi fant svar på noen av sprint spørsmålene våre. Når det gjelder frontend-delen og hvordan vi ønsker at løsningen skal se ut, har vi fått en bedre oversikt og begynte gjennom spørsmålene å se for oss hvordan vi vil ha det. For backend-delen gjenstår det fortsatt noen spørsmål, men vi har tro på at dette vil gå bra videre i prosessen.

Kunne dere ha gjort noe annerledes?

Vi kunne ha fordelt arbeidsoppgavene jevnere gjennom sprintdagene. Slik vi jobbet, oppstod det perioder med mye arbeid, og flere oppgaver måtte flyttes til senere dager. I tillegg kunne vi ha laget en tydeligere og mer konkret oversikt over hva løsningen skulle inneholde før vi startet arbeidet i Miro. Dette ville gitt oss et bedre utgangspunkt og gjort prosessen mer effektiv.

Hva var dere spesielt fornøyde med?

Gruppen jobber godt sammen og blir raskt enige om beslutninger. Vi samarbeider fint, og alle får uttrykke sine meninger. Vi er gode på å fordele oppgaver og sette realistiske forventninger til hverandre. Vi er fleksible og har gode diskusjoner som sikrer at vi jobber mot et felles mål.

Oppsummering

Gruppen fant svar på flere av sprint spørsmålene, særlig innen frontend, hvor prosessen ga en klarere forståelse av hvordan løsningen bør se ut. Backend-spørsmålene gjenstår delvis, men gruppen er trygg på at disse vil løse seg senere. Sprinten viste behov for bedre fordeling av arbeidsmengde og en tidligere avklaring av løsningens innhold.

Samarbeidet i gruppen var en tydelig styrke. Diskusjonene var konstruktive, beslutninger ble tatt effektivt, og oppgavene ble fordelt realistisk slik at alle kunne bidra. Ved en ny sprint ville gruppen prioritert bedre planlegging av oppmøte og en mer konkret oversikt over oppgaven fra start.

Hva ville dere gjort annerledes hvis dere skulle gjennomføre en lignende sprint igjen?

Vi ville planlagt oppmøte bedre i forhold til jobb, og etablert en tydelig oversikt over oppgaven og innholdet i løsningen tidligere i prosessen. Dersom dette blir etablert tidlig under prossessen, vil flyten under prosjektet øke.
